

嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程

水土保持设施验收报告

利水工程咨询有限公司

二〇二〇年九月

目录

前言.....	1
1 工程概况及工程建设水土流失问题.....	4
1.1 工程概况.....	4
1.2 项目区自然和水土流失情况.....	6
1.3 工程建设水土流失问题.....	8
2 水土保持评估技术体系.....	9
2.1 评估的主要依据.....	9
2.2 评估内容.....	11
2.3 评估人员构成.....	11
2.4 评估方法及路线.....	12
3 水土保持方案和设计情况.....	14
3.1 水土保持方案报批情况.....	14
3.1 批复的水土流失防治责任范围.....	14
3.2 水土流失防治分区和防治措施.....	14
3.3 评估的扰动范围及评估目标.....	15
4 水土保持设施建设情况.....	17
4.1 工程措施完成情况评估.....	17
4.2 植物措施完成情况评估.....	18
4.3 临时措施完成情况评估.....	19
5 水土保持工程质量评价.....	20
5.1 质量管理体系.....	20
5.2 工程措施质量评价.....	22
5.3 植物措施质量评价.....	25
6 水土保持监测评价.....	27
7 水土保持监理评价.....	28
8 水土保持工程投资及资金管理评价.....	29
8.1 水土保持方案批复投资.....	29
8.2 实际完成水土保持工程投资.....	29
8.3 投资控制和财务管理.....	31
9 水土保持效果评价.....	33
9.1 水土流失治理情况.....	33
9.2 公众满意度调查.....	34
10 水土保持设施管理维护评价.....	36
11 完善意见.....	37
12 综合评估.....	38
13 遗留问题及建议.....	39

附：

附图 1 项目总平面布置图

附图 2 水土保持措施布设及水土流失防治责任范围图

前 言

本项目为青岛西海岸新区建筑工务中心投资建设的嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程。项目建设地点位于青岛市西海岸新区薛家岛街道，西起嘉陵江东路，东至长江东路。本项目占地面积7.86hm²，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，所需各种原材料及水、电等资源供应充足，是项目开发建设的理想地段。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号）、山东省水利厅《关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字〔2016〕1号）和青岛市人民政府2016年发布的《关于划分市级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》，确定项目区属于五莲山北麓省级水土流失重点治理区范围。土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，水土流失以轻度水力侵蚀为主兼有少量的风力侵蚀，影响水土流失的自然因素主要是降雨、地形、土壤和植被，其中降雨和地形处于非常不利的状态。开发建设过程中的乱挖乱采、乱堆乱放以及陡坡开荒、铲草皮、乱砍滥伐、乱牧等不合理的人为活动，产生或加剧了水土流失。

该项目是新建项目，本项目设计单位为沈阳市市政工程设计研究院青岛开发区分院；主体工程施工单位为青岛瑞源工程集团有限公司；监理单位为青岛信达工程管理有限公司；运行单位为青岛西海岸新区建筑工务中心。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《山东省水土保持条例》等有关法律、法规的要求，青岛西海岸新区建筑工务中心委托利水工程咨询有限公司编制《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持方案报告书》。2020年8月，西海岸新区城市管理局（水务局）对报告书送审稿进行了评审，编制单位按照专家组审查意见对报告书进行了修改完善，最终完成了报告书（报批稿）的编制。2020年9月27日，青岛市黄岛区行政审批服务局以青黄农审字【2020】329号文对本项目水土保持方案进行了批复。

在工程建设过程中，青岛西海岸新区建筑工务中心按照批复的水土保持方案进行设计和施工，落实了水土保持工程投资，专门成立了水土保持方案实施组织机构，负责水土保持工作的组织、协调、设计、施工、监督等工作。通过工程措施、植物措施和临时措施的实施，扰动土地得到了有效治理，达到了方案要求的目标。

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定，受建设单位的委

托，我单位承担了嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持设施验收的技术评估工作。接受委托后，我公司立即成立了技术评估组、分综合、工程、植物和经济财务四个专业组开展本项目的评估工作。开始对嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持设施进行验收技术评估。

评估组详细了解了嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程的建设情况和水土保持工作情况，从综合、工程、植物和经济四个方面审阅了工程档案资料，抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程质量和工程缺陷，认真、仔细核实各项措施的工程数量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持措施的功能进行评估，同时与当地水行政主管部门座谈，了解嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持工作开展情况，并分组提出了评估意见。

本次验收评估主要完成的工作有：对工程现场进行调查，对照水土保持方案报告书，认真核查、比较已完成的水保设施，并统计全部设施的工程量；对不符合水保要求的设施提出了整改意见，并督促建设单位落实整改；收集了建设单位关于水土保持设施设计、施工的相关资料，完成了水保设施质量的评估；在汇总综合、工程、植物、财务四个评估小组最终评估意见的基础上，通过认真分析研究，编写完成本技术评估报告。

在评估期间，得到了各级水行政主管部门、青岛西海岸新区建筑工务中心以及有关施工单位、监理单位的大力支持和协助，在此一并致谢！

嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持设施验收评估特性表

验收工程名称		嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程		验收工程地点	青岛市西海岸新区薛家岛街道，西起嘉陵江东路，东至长江东路		
验收工程性质		新建	验收工程规模		项目占地面积7.86 hm ²		
所在流域		淮河流域	所属水土流失重点防治区		五莲山北麓省级水土流失重点治理区		
主体工程工期		2018年9月~2020年6月					
防治责任范围(hm ²)		实际发生的扰动范围		7.86			
		运行期的防治责任范围		7.86			
水土流失评估目标	水土流失总治理度	95%	实际完成水土流失防治目标	水土流失总治理度	99%		
	土壤流失控制比	1		土壤流失控制比	99%		
	渣土防护率	98%		渣土防护率	1.0		
	表土保护率	95%		表土保护率	99%		
	林草植被恢复率	97%		林草植被恢复率	99%		
	林草覆盖率	27%		林草覆盖率	32.1%		
主要工程量		工程措施	表土剥离、透水砖铺设、雨水排水工程、植草地坪、蓄水池、土地整治				
		植物措施	景观绿化、植草地坪草皮铺设、下沉式绿地、行道树绿化				
		临时措施	密目防尘网、临时排水沟、沉砂池、洗车池、临时堆土防护				
工程质量评定		评定项目	总体质量评定		外观质量评定		
		工程措施	合格		合格		
		植物措施	合格		合格		
实际完成水土保持投资（万元）				226.9			
工程总体评价		水土保持设施符合国家水土保持相关技术标准、规程的要求，各项工程安全可靠质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收。					
主体设计单位		沈阳市市政工程设计研究院青岛开发区分院		施工单位	青岛瑞源工程集团有限公司		
				监理单位	青岛信达工程管理有限公司		
验收工作总结技术服务单位		利水工程咨询有限公司		建设单位	青岛西海岸新区建筑工务中心		
单位地址		河南省郑州市金水区姚砦路133号12号楼15层		单位地址	西海岸新区漓江西路987号		
法定代表人		张海涛		法定代表人	王海建		
联系人/电话		杨经理13730990718		联系人/电话	任华/86988361		
传真/邮编		/		传真/邮编	266000		
邮箱		13730990718@163.com		邮箱	-		

1 工程概况及工程建设水土流失问题

1.1 工程概况

1.1.1 工程位置

嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程为新建项目，项目位于青岛市西海岸新区薛家岛街道，西起嘉陵江东路，东至长江东路。

1.1.2 主要经济技术指标

项目占地面积 7.86hm²，道路全长 1464m。桩号 K0+000~K0+367.275 范围内，道路红线宽度 28~50m，主要建设内容包括：道路工程、管线工程、绿化工程、路灯工程及交通设施等。

1.1.3 工程场址总平面布置

本次实施嘉陵江路连接线为一条曲线形城市主干路，道路西起嘉陵江东路，东至长江东路，道路全长1463.753m平面线形设计依据规划线位及规范对平面线型标准的要求布置，全线设置圆曲线4处，最大圆曲线半径为1000m，最小圆曲线半径250m，在直线与小半径圆曲线连接处设置缓和曲线。并对主要路口进行渠化设计。

拟建场区地貌类型为剥蚀残丘地貌，地形起伏较大，钻孔孔口标高 5.52~37.52m。现规划为城市道路用地。项目竖向结合场区现状标高、周边规划路网和途经水系的洪水位标高进行设计，能够满足减少土方开挖和有组织排水的需求。主体工程设计对用地进行整平，合理进行场地竖向设计，尽可能减少土方工程量，保证内部平坦。根据场区竖向设计，项目建成后竖向标高在 5.28~31.91m 之间。

给排水系统：嘉陵江路整体地势中间高两端低。根据地势沿线敷设污水、雨水管道，就近分别接入规划污水管道、雨水管道。在道路北侧放坡线底部设置截洪沟，用于截流被侧山体洪水。

沿线敷设给水管道，与现状嘉陵江路给水管道及长江路路现状给水管道衔接，在沿线设阀门井、消火栓等附属设施。

公共配套设施：道路沿线相交道路包括：嘉陵江东路、杜威学校配套道路（规划路）、华裕小区配套道路、安子向阳社区配套道路（常山路）、茂源·长青山庄西侧配套道路（规划路）、长江东路，本次设计对相交道路采用平面信号灯制交叉口方案，并同步设置路灯和各类交通设施等附属设施。新建嘉陵江路连接线与现状嘉陵江东路、华裕小区配套道路、安子向阳社区配套道路（常山路）等道路“T形”交叉，在交叉口范围内拓宽出一条右转专用车道。交叉口范围内设置信号灯、交通标志指示牌，施画交通

标线等。新建嘉陵江路连接线与现状长江东路十字交叉，在交叉口范围内拓宽出一条右转专用车道，并设置交通导流岛。交叉口范围内结合新港山路、长江东路的行驶车辆设置信号灯、交通标志指示牌，施划交通标线等。新建嘉陵江路连接线周边杜威学校、茂源·长青山庄已经开始实施建设，为项目配套的两条规划道路与新建嘉陵江路连接线平面相交，本次道路建设时需要给两条规划道路预留开口。

1.1.4 参建的有关单位

表 1-1 参建相关单位

建设单位	青岛西海岸新区建筑工务中心
主体设计单位	沈阳市市政工程设计研究院青岛开发区分院
主体施工单位	青岛瑞源工程集团有限公司
水土保持方案编制单位	利水工程咨询有限公司
运行单位	青岛西海岸新区建筑工务中心

1.1.5 建设工期及投资

建设工期：工程于 2018 年 9 月开工（包括施工准备期），2020 年 6 月完工，总工期 22 个月。

项目投资：本项目总投资 16845 万元，土建投资 13949 万元。本项目所需资金来源为西海岸新区区政府。

1.2 项目区自然和水土流失情况

1.2.1 自然环境概况

（1）地形地貌

青岛西海岸新区属鲁中南低山丘陵地区。地势呈西高东低、北高南低，自西北向东南倾斜入海，中部成东北、西南走向隆起。西海岸新区按成因和形态共分为四种地貌类型：侵蚀剥蚀低山、侵蚀剥蚀丘陵、冲、洪积平原、滨海平原。

拟建场区地貌类型为剥蚀残丘地貌，地形起伏较大，钻孔孔口标高 5.52~37.52m。现规划为城市道路用地。项目竖向结合场区现状标高、周边规划路网和途经水系的洪水位标高进行设计，能够满足减少土方开挖和有组织排水的需求。主体工程设计对用地进行整平，合理进行场地竖向设计，尽可能减少土方工程量，保证内部平坦。根据场区竖向设计，项目建成后竖向标高在 5.28~31.91m 之间。

（2）水文、地质

青岛西海岸新区内河流均为季节性河流。境内山水相连，形成了河流源短流

急的特点。较大的河流有风河、吉利河、白马河、潮河、甜水河、错水河、横河、胶河、巨洋河、洋河等河流。地下水主要接受大气降水下渗补给，以地下径流为主要排泄方式，伏下微风化~未风化花岗岩为良好的隔水层，稳定水位标高最高为 3m。场区地下水、地表水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水及干湿交替作用下均为微腐蚀。

项目所在地区主要接受上游地下水迳流和本地区降水入渗的补给,含水层由浅部潜水层及深部多层承压水组成。潜水层的透水性差,承压水层由厚度不等的砂、砾石组成。

项目区所在的流域管理机构为淮河水利委员会。本地区属东南沿海水系，均为季节性河流。境内山水相连，形成了河流源短流急，单独直接入海的特点。

（3）气候与气象

西海岸新区地处北温带季风区域，属暖温带半湿润季风气候。城区由于海洋环境的直接调节，受来自洋面上的东南季风及海流、水团的影响，故又具有显著的海洋性气候特点。空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明。春季气温回升缓慢，较内陆迟1个月；夏季湿热多雨，但无酷暑；秋季天高气爽，降水少，蒸发强；冬季风大温低，持续时间较长。据气象监测站发布的观测资料（1981~2015年），城区多年平均气温 12.8℃，极端最高气温 41.0℃（2002年7月15日）极端最低气温-21.1℃（1981年1月27日）。全年8月份最热，平均气温 25.3℃；1月份最冷，平均气温-0.5℃。日最高气温高于 30℃的日数，年平均为 11.4天；日最低气温低于-5℃的日数，年平均为 22天。年平均大风天数 12.4天，年平均风速为 2.2m/s，以东南风为主导风向。年平均相对湿度为 73%，7月份最高，为 89%；12月份最低，为 68%。海雾多、频，年平均雾日数 33.1天。无霜期年平均 209.7天。多年平均最大冻土深度 50cm。多年平均降水量为 740mm（1952~2015年），春、夏、秋、冬四季雨量分别占全年降水量的 14.4%、62.2%、18.9%、4.5%。年平均降水日数 75.4天，年最大降水量 1380.1mm（1964年），年最小降水量 355.1mm（1981年）。

（4）土壤植被

项目区土壤类型为棕壤，占区域部分地表存在表土层，厚度约为0.3m，能够作为表土利用。西海岸新区属暖温带落叶阔叶林区，境内有各种植物393种。其中，人工种植树种主要有旱柳、白蜡、刺槐、国槐、速生杨、苦楝、冬枣、蜜

桃等；野生植物主要有芦苇、怪柳、杞柳、马绊草、黄须菜、蒿类、野大豆、益母草、罗布麻、茵陈等。项目区林草覆盖率约为46.0%。

1.2.2 水土流失情况

随着城市建设的快速发展，新建和旧城改造等建设项目不可避免。在项目的开发建设设计阶段，主体设计单位由于专业角度的不同，设计往往难以形成完整的水土流失防治措施体系，特别是容易忽略施工过程中的临时性防护措施。加上现状水土保持科技水平应用还比较偏低、公众法制观念淡薄，造成项目建设过程中防护措施不完善、措施缺乏针对性。项目区内原已治理的水土流失面积，目前仍在发挥保水固土作用的水土保持设施，因原建设标准低、工程多老化失修，水保功能大幅降低。

结合山东省水土流失强度分布图及对项目区现场调查，确定项目区以水力侵蚀为主兼有风力侵蚀，所在地处于轻度土壤侵蚀范围，平均侵蚀模数约为 $250\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。根据《全国水土保持规划（试行）》，该区域属于北方土石山区→泰沂及胶东山地丘陵区→胶东半岛丘陵蓄水保土区。按照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL90-2007)，西海岸新区位于以水力侵蚀为主的北方土石山区，容许土壤流失量为 $200\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

1.3 工程建设水土流失问题

根据相关施工记录、竣工文件及现场勘测，参考相关施工记录和竣工资料，经过分析计算得，在工程建设施工过程中按照设计的施工工艺和流程，合理调度开挖和填方，土石方平衡状况与方案设计变化不大。实际土石方流转情况见表 1-2。

表1-2 本项目水土保持监测土石方流转一览表 单位：万m³

防治分区		挖方	填方	调入		调出		余方
				数量	来源	数量	去向	
①道路工程区	工程建设	28.40	8.40					
	表土	0.90	0			0.90	绿化区	
	小计	29.30	8.40					
②绿化区	工程建设	12.04	5.04					
	表土	0.36	1.26	0.90	道路工程区			
	小计	12.40	6.30					
合计	工程建设	40.44	13.44	0		0		
	表土	1.26	1.26	0.90		0.90		
	合计	41.70	14.70	0.90		0.90		

项目总挖方量为 41.70 万 m³（其中表土剥离 1.26 万 m³），总填方量 14.70 万 m³（其中表土回覆 1.26 万 m³），无借方，余方约 27 万 m³，运送至青岛胜季丰建材有限公司回收并加工利用。

工程共计扰动土地面积为 7.86 hm²，全部为永久占地，占地类型为道路用地。施工对地表植被影响较大，造成以水力侵蚀为主的地表侵蚀。

工程水土流失主要发生在施工准备期、施工期，各阶段流失特点差异较大：施工准备期：部分区域需平整场地，造成土地裸露，发生水土流失。施工期：建筑基础开挖，会扰动破坏原地貌；挖方和填方在时间上有差距，如不及时覆盖或拦挡，裸露土壤在风、雨天易发生水土流失；堆放机械、建筑材料等，使地面表土受到碾压，也易导致水土流失。

2 水土保持评估技术体系

2.1 评估的主要依据

评估工作的主要依据包括法律法规、规章、规范性文件、技术规范，技术资料主要有设计资料、监理资料、合同资料、验收资料、施工资料、工程变更说明、财务决算等内容。

2.1.1 法律法规

(1) 《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人大常委会第二十次会议通过，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订）；

(2) 《山东省水土保持条例》（2014年5月30日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2014年10月1日起施行）；

2.1.2 部委规章

(1) 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995年水利部令第5号发布，2005年水利部令第24号修订）；

(2) 《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年水利部令第12号）；

(3) 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月14号水利部令第16号，2005年7月8日水利部令第24号《水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定》修改）；

(3) 《水利工程建设监理规定》（2006年水利部第28号令）。

2.1.3 规范性文件

(1) 《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发[1993]5号）；

(2) 《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部水保[2007]184号）；

(3) 《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号文）；

(4) 《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》水利部水保[2003]89号文）；

(5) 《关于加强开发建设项目水土保持督察工作的通知》（水利部办水保[2007]94号）；

(6) 《关于规范开发建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水保

[2009]187号);

(7) 《水利部办公厅关于印发<全国水土保持区划（试行）>的通知》（办水保[2012]512号);

(8) 《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号);

(9) 《关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综[2014]8号);

(10) 《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试行）>的通知》（办水保[2015]139号);

(11) 《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（办水保〔2016〕65号);

(12) 《省物价局 省财政厅 省水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》（鲁价费发〔2017〕58号);

(13) 《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字[2016]1号);

(14) 《山东省人民政府关于全省水土保持规划（2016—2030年）的批复》（鲁政字〔2016〕270号);

(15) 《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号);

(16) 《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号)

2.1.4 规范标准

(1) 《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008);

(2) 《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008);

(3) 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007);

(4) 《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006);

(5) 《水土保持监测技术规程》（SL277-2002);

(6) 《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011);

(7) 《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006);

(8) 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007);

(9) 《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008)。

2.1.5 技术文件和技术资料

- (1) 《黄岛区统计年鉴》（2018年）；
- (2) 《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持方案报告书》；
- (3) 工程竣工验收相关资料。

2.2 评估内容

《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》第六条规定：水土保持设施验收的范围应当与批准的水土保持方案及批复文件一致。本次验收的范围为嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程占地范围。本次水土保持设施竣工验收工作重点内容包括：

- (1) 评价建设单位对水土流失防治工作的组织管理；
- (2) 评价水土保持方案后续设计及实施情况；
- (3) 评价施工单位制定和遵守相关水土保持工作管理制度的情况，调查施工过程中采取的水土保持临时防护措施的种类、数量和防治效果；
- (4) 抽查核实水土保持设施的数量；对重要单位工程进行核实和评价，检查评价其施工质量，检查工程存在的质量缺陷是否影响工程使用寿命和安全运行；评价水土保持监理、监测工作；
- (5) 判别建设项目的扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标是否满足建设项目水土流失防治标准，分析能否达到批复同意的水土流失防治目标；
- (6) 检查水土流失防治效果与生态环境恢复和改善情况，调查施工过程中水土流失防治效果，分析评价水土保持设施试运行的效果及水土保持设施运行管理维护责任落实情况；根据水土保持质量监督部门或监理单位的工程质量评定报告或评价鉴定意见，评估工程质量等级或质量情况；分析评价水土保持投资完成情况；开展公众调查，了解当地群众对建设项目水土保持工作的满意程度，总结成功经验和不足之处；
- (7) 总结水土流失防治技术、管理的经验和教训；
- (8) 提出行政验收前、后需要解决的主要问题。

2.3 评估人员构成

我单位十分重视嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工

程水土保持设施的技术评估工作，通过精心挑选和科学搭配，充分考虑人员知识结构，组成了技术评估组，专业涉及水土保持学、水利工程、植物学、生态学、财务经济类等。同时，为确保评估工作的顺利开展，全面掌握嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程建设过程中水土保持设施的建设、运行情况，特邀请青岛西海岸新区建筑工务中心主管人员参与现场检查评估工作，并多次召开评估工作座谈会。

2.4 评估方法及路线

评估工作以法律法规和批准的水土保持方案为依据，以技术标准、规范为准绳，采取外业和内业相结合、问卷调查和座谈相结合、全面核查和重点详查相结合、利用常规设备和先进仪器相结合等方法，对工程水土保持设施建设的内容和过程进行了全面、细致、系统的评估。技术评估工作主要分以下几个步骤，技术路线图见图 2-1。

(1) 前期准备。收集嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程有关资料，制定工作计划和各组实施方案，并进行人员分工。

(2) 听取介绍。评估组到达项目运行管理单位，认真听取了相关单位关于工程建设和水土保持方案实施情况的介绍，全面了解了项目的一般情况，并据此召开组内碰头会，确定现场查勘的具体计划。

(3) 现场勘查。对本工程水土保持措施进行了全面检查，重点检查排水、地面铺装以及植物绿化等防护措施，按照涵盖各种水土保持措施的原则，对重要单位工程进行重点检查：

①工程措施采用实地测量和典型调查法。检查的重点为工程的外观形状、轮廓尺寸、材料质量、表面平整度、填方密实度、现场景观恢复以及缺陷等。对重点部位工程措施的几何尺寸进行实测，用 GPS 定位，并做好现场记录。

②植物措施采用了全面检查和抽样调查的方法。在实际查勘中，采用 GPS 定点，样方按“行数”或“地块”作为调查样方，每区样方数量不小于 2 个，每个样地的密植灌木篱和草地面积不小于 15m²，对样方内的灌草进行现场观测，检查灌草成活率（保存率）、覆盖度、生长情况等；由于该类工程绿化设计全面，可进行全面调查，了解其栽植数量、生长情况、成活率等。

(4) 资料查阅。评估组重点查阅了嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持方案和设计资料；施工监理、质量监督、竣工图等

方面的资料；施工组织设计、施工合同、设计变更、监理通知以及质量评定资料、施工单位竣工报告、监理报告等。

（5）公众调查。为了切实反映工程建设中的水土保持措施落实情况，评估组结合现场查勘，认真征求了当地干部群众对项目建设的意见和看法。满意度调查的重点主要是针对项目弃土弃渣管理、土地恢复、植被建设以及对当地经济、环境影响等几方面。评估组通过询问、调查共计形成满意度调查问卷 89 份。

（6）后期座谈。召开了有建设单位、编制单位等单位参加的座谈会，通报了技术评估的初步成果，征求了各方面意见，并对存在问题向建设单位提出了补充完善意见。

（7）复核检查。对建设单位补充完善后的工程，评估组进行了检查复核。

（8）整理评价。根据评估情况及建设单位完善情况，通过深入研究，分析评价，综合组、工程措施组、植物措施组、经济财务组分别提出了评估意见。依据各专业组的评估意见和各级水行政主管部门的意见，综合分析，修改完善，形成了该技术评估报告。

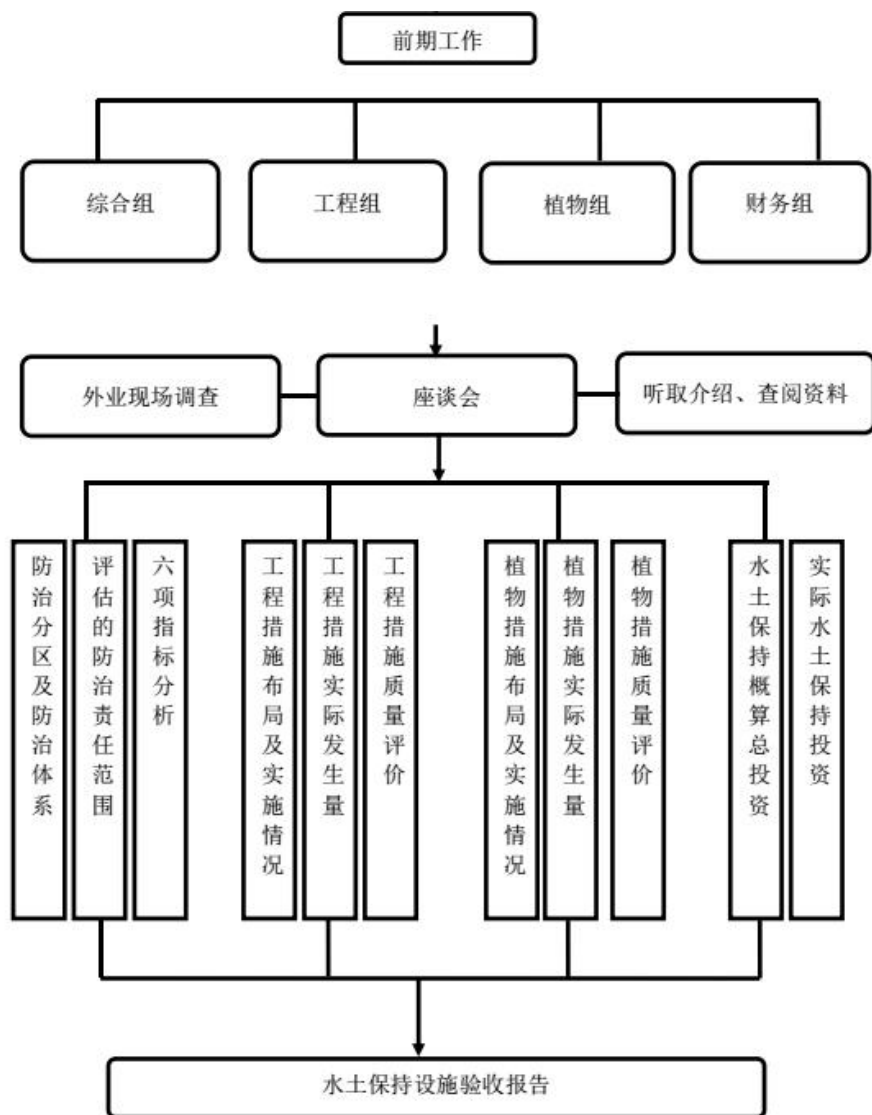


图 2-1 项目水土保持设施技术评估技术路线图线

3 水土保持方案和设计情况

3.1 水土保持方案报批情况

根据《中华人民共和国水土保持法》和《山东省水土保持条例》等有关法律、法规的要求，青岛西海岸新区建筑工务中心委托利水工程咨询有限公司编制《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持方案报告书》。2020年8月编制单位完成了《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持方案报告书》（送审稿）。

2020年9月，青岛西海岸新区城市管理局对报告书送审稿进行了评审，编制单位按照专家组审查意见对报告书进行了修改完善，最终完成了报告书（报批稿）的编制。2020年9月27日，青岛市黄岛区行政审批服务局以青黄农审字【2020】329号文对本项目水土保持方案进行了批复。

3.1 批复的水土流失防治责任范围

根据批复的《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持方案报告书》（报批稿），批复的水土流失防治责任范围共计7.86 hm²，详见表3-1。

表3-1 方案批复的水土流失防治责任范围 单位：hm²

项目组成	占地面积（hm ² ）			占地类型
	永久占地	临时占地	合计	
道路工程区	5.34	/	5.34	道路用地
绿化区	2.52	/	2.52	
合计	7.86	/	7.86	

3.2 水土流失防治分区和防治措施


3.2.1 防治分区

根据批复的《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持方案报告书》（报批稿），嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程主要分为主体建筑区、道路广场区、景观绿化区，项目区总面积7.86 hm²，全部为永久占地。项目占用的土地利用类型为道路用地。

3.2.2 防治措施体系

根据批复的《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程

水土保持方案报告书》（报批稿），嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程各分区主要防治措施包有：

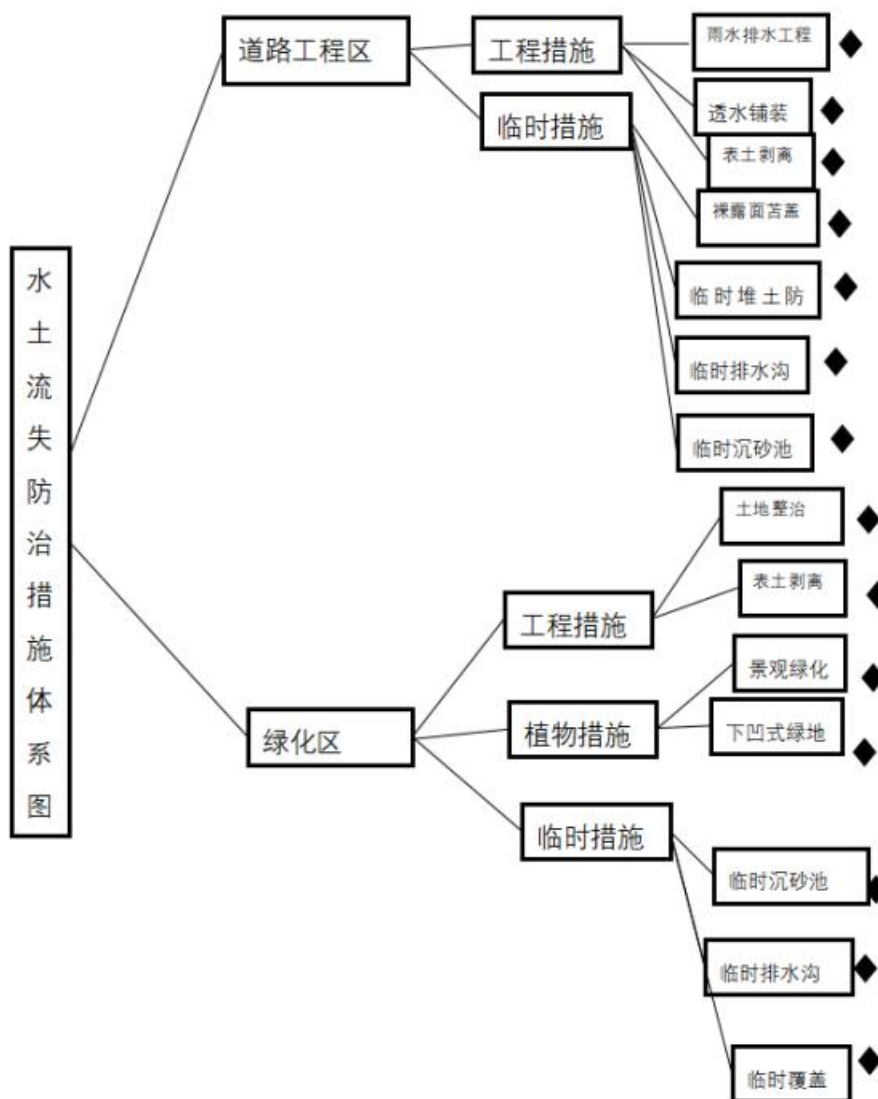

3.3 评估的扰动范围及评估目标

3.3.1 评估的扰动范围

本项目建设期间实际扰动范围为7.86 hm²，全部为永久占地。建设单位在建设过程中严格控制用地范围，实际发生的扰动面积与方案批复的面积一致，总体面积没有发生变化。运行期防治责任范围为7.86 hm²。

表 3-3 实际扰动面积变化表

防治责任范围	方案确定防治责任范围	实际发生面积	差值
项目建设区	7.86	7.86	0

3.3.2 防治目标

根据山东省人民政府发布的《山东省水土流失重点防治区通告》，确定项目区为非山东省水土流失防治分区，由于位于青岛西海岸新区，按照《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，确定本方案的水土流失防治标准执行建设类一级标准。

根据青岛市水行政主管部门划分的水土流失分区，市区居民点及工矿交通用地(包括水域和林地)为轻度侵蚀区，项目区原现状虽高差较大，但裸露面较小，综合土壤侵蚀背景值为 $250\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

按照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL90-2007)，西海岸新区位于以水力侵蚀为主的北方土石山区，土壤侵蚀容许流失量为 $200\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。评估目标结果见表3-4。

表 3-4 本工程水土流失防治的评估目标

防治目标	一级标准	方案目标值	评估目标值
水土流失总治理度	95%	95%	99%
土壤流失控制比	1	1	1
渣土防护率	98%	98%	99%
表土保护率	95%	95%	99%
林草植被恢复率	97%	97%	99%
林草覆盖率	27%	27%	32.1%

4 水土保持设施建设情况

4.1 措施完成情况评估

本项目施工期间主要采取的措施为：

1、工程措施

雨水排水工程、土地整治、透水砖铺装。

2、植物措施

景观绿化工程。

3、临时措施

基坑截水沟、基坑沉砂池、临时沉砂池、密目防尘网苫盖、填土草袋拦挡、密目防尘网覆盖、临时排水沟开挖。

4.2 工程量分析

本项目实际完成的工程量与方案设计的工程量相比存在差异，本工程布设的水土保持措施主要有工程措施、植物措施和临时措施。经现场复核，水土保持措施合格。水土保持措施中，实际完成工程措施、植物措施和临时措施工程量较水保方案设计有所变化。这是根据实际情况，为了达到更好的水土保持效果进行的适当的调整。

水土保持措施设计量见表 4-1。

表4-1 水土保持工程措施设计量表

防治分区	措施类型	项目	单位	数量	完成量	
道路工程区	工程措施	雨水排水工程	m	2928	2928	
		表土剥离	万m ³	0.90	0.90	
		透水铺装	m ²	10244	10244	
	临时措施	裸露面苫盖		m ²	12000	12000
		临时排水沟	开挖	m ³	100	100
			回填	m ³	100	100
		临时沉沙池		座	1	1
		密目防尘网覆盖		m ²	1800	1800
		临时堆土防护	播撒草籽	kg	15	15
			填土草袋	m ³	150	150
景观绿化区	工程措施	土地整治	m ²	25200	5000	
		表土剥离	万m ³	0.36	0.36	
	植物措施	景观绿化	m ²	25200	25200	
		下凹式绿地	m ²	12800	12800	
	临时措施	裸露面苫盖		m ²	25200	25200
		临时排水沟	开挖	m ³	1200	1200
			回填	m ³	1200	1200
		临时沉沙池		座	5	5

4.3 措施评价

4.3.1 工程措施评价

本工程水保设施完成量与批复的水保方案相比，按照实际情况，水土保持措施工程量有所变化，水土保持的效果有所增加。综上所述，本工程的工程措施完成量整体上可达到验收标准。

4.3.2 植物措施评价

植物组查阅了植物绿化工程施工招标合同、栽种植情况、成活率和保存率等资料，全面检查了项目区乔、灌木的株行距，均符合设计要求。通过样方调查，评估组认为，该工程植物措施完成量达到合格标准。

4.3.3 临时措施评价

本工程水保设施完成量与批复的水保方案相比，各临时措施均有所变化。主要原因是主体工程的施工时序、施工工艺、施工方式的优化，但防护面积占扰动面积的比重并未减少，已完成的工程量仍可达到水保防护设计的要求。并且在实际建设中

建设单位对易发生水土流失的部位进行了重点防护。这些措施进一步完善了水保措施体系。综上所述，本工程的临时措施完成量整体上可达到验收标准。

5 水土保持工程质量评价

5.1 质量管理体系

本项目全面实行了项目法人制、招标投标制和合同管理制，把水土保持工程的建设与管理纳入到整个工程的建设和管理体系中，形成组织建设、设计、施工、监理及地方水土保持主管部门“五位一体”的管理模式。

5.1.1 建设单位的质量控制体系

青岛西海岸新区建筑工务中心作为嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程的项目法人，专门成立了以单位领导为组长的“嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程领导小组”，领导和协调本工程的建设，并负责签订嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程的设计、施工、监理、调试等工程合同，行使管理职能，同时全面组织协调水土保持工程的实施工作。

嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程管理处青岛西海岸新区建筑工务中心的领导下，制订了《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程质量管理暂行办法》、《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程施工质量奖惩考核办法》等工程质量管理制，依照国家基建体制改革的要求严格按照“五制”（项目法人责任制、招投标制、监理制、合同制、资本金制）的模式进行规范化的管理。加强了工程过程控制，在设计、设备和大宗材料的采购、施工、检测与调试等各环节实行全过程的质量控制和监督。根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。为保证质量，首先提高施工图的质量，将水土保持方案的措施落实到施工图中，优化设计、合理布局；管理处还经常参加施工单位质量保证体系、施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，管理处实时派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，定期召开质量分析会，发现问题立即要求设计、施工和监理单位进行处理。

5.1.2 监理单位的质量控制体系

青岛信达工程管理有限公司负责工程监理。监理工作目标包括对该项目的水土保持工程实施质量控制、进度控制、投资控制、实行项目的合同管理和信息管理，协调有关各方的关系，为实现项目的总体目标服务。具体目标如下：

（一）质量控制、进度控制、投资控制

质量控制目标：使其所有工程质量均符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其他合理标准。进度控制目标：使其工程进度满足施工进度安排，即该项目水土保持工程的工程措施在2020年4月前完成；在不受施工影响的防治责任范围内的植物措施要求在2020年5月前完成。投资控制目标：在不受施工、其他自然或人为因素变化影响的情况下，使其水土保持投资控制在水土保持方案概算范围内。

（二）项目合同管理和信息管理

合同管理目标：使其各合同规定的责任事项和法定承诺得以妥善履行。信息管理目标：做到信息准确、及时、通畅，并且满足建设过程中设计、材料和设备供应等符合施工节奏，保证各工程技术、经济资料得到及时整理。

（三）协调参与工程建设及相关各方关系。

5.1.3 施工单位的质量保证体系

水土保持工程的建设选择实力雄厚、管理先进、施工经验丰富、信誉良好的施工单位进行施工，这些施工企业，都有一整套完善的质量管理措施和质量保证体系。

一是都建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行国务院第279号令以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理》的通知，层层落实工程质量责任、签订质量责任书，明确技术负责人及行政负责人接受建设单位、监理以及监督部门全方位、全过程的监督；三是按照ISO9002质量标准体系要求，成立了以项目部经理为第一责任人、项目总工程师为主管人、质量保证科为专职质检部门和各施工队（组）配备兼职质检员的质量管理机构。

（1）项目部按GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、公司管理手册及程序文件要求建立质量保证体系，编制《施工组织设计》及其他质量保证措施文件并提交项目法人和监理工程师，以便监理工程师在工程中监督检查实施情况。健全质量管理组织机构，配备足够和适任的质检人员。严格执行标准、规范、设计文件、项目法人制定的实施办法以及监理工程师依据合同签发的一切指令。

（2）建立健全质量风险机制，实行“质量风险抵押金”制，签定内部质量合同，质量工作优秀，无质量事故者，加倍奖励，否则没收抵押金并加倍处罚。

（3）质量管理实行问责制，强化质量过程管理，并提高工程质量一次通过

率。使责任落实到每一个人。如有不合格项便依据相应条款给予施班组经济处罚，检验一次性通过的将给予一定的奖励，从而保证了分项工程验收一次通过率，也有效控制了施工进度。

(4) 积极配合并接受监理工程师按规定对工程进行的质量监督工作。分部、分项工程的质量检验，应提前一段时间书面通知监理工程师并按其规定的日期进行，认真听取意见并及时改进。按规定进行质量检查和中间验收，隐蔽工程和关键工序应对过程进行连续监控。

(5) 施工过程按程序文件实行“三检制”，设立质量管理R、H、W点，并对管理点实施有效控制。事故处理实行“四不放过”原则。特殊工序作业人员需经专业培训，考试合格后持证上岗。

(6) 施工记录必须按原始记录由施工人员填写，填写人和审核人应对施工记录的及时性、真实性、准确性和完整性负责，并经监理工程师检查合格签署意见。

(7) 对不合格分项、分部工程必须进行返工。严禁不合格分项工程流入下道工序，有关责任人要针对出现不合格的原因采取必要纠正和预防措施。

(8) 施工结束时，作好施工场地的清理工作，所有的施工临建必须清理干净，不留任何施工垃圾。

在整个项目的实施过程中，由于领导重视，措施得力，体系健全、管理严格、全员牢固树立“质量第一”的指导思想，把质量工作作为重点的工作来抓，有力地保证了质量工作的顺利开展，为整个工程的创优打下了坚实的基础。

5.1.4 质量监督

本工程由项目涉及的地方水土保持监督管理部门负责执法监督。对工程施工中方案设计措施落实情况监督检查，针对工程施工过程中存在的措施的缺失提出整改意见。

本项目由于建立健全了施工单位的质量保证体系、监理单位和质量控制体系、政府部门的质量监督体系，严格的质量保障措施得到落实，从而保证了工程施工质量，目前没有发生重大的质量事故。评估组查阅了施工单位施工组织设计、监理单位的监理大纲、业主单位的管理档案、监督部门的监督记录，并经过实地查勘、查阅相关文件，认为质量管理体系是健全的和完善的，各项工程的质量保证资料比较齐全，能保证水土保持工程质量。

5.2 工程措施质量评价

5.2.1 质量评定办法

根据《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)，工程质量评定主要是以单元工程评定为基础的，其评定等级分为优良、合格两级。详见表5-1。

表 5-1 工程质量检测方法表

序号	检测类别	检测方法
1	单元工程	对于重要的单元工程，按照《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)规定的质量等级要求，根据该单元工程施工的实际情况，参照前述的质量评定标准进行检测。
2	分部工程	在单元工程检测的基础上，根据各单元工程质量检测结论，参照分部工程质量标准，便可得出该分部工程的质量等级，以便决定可否检测；对单位或分部土建工程完工后转交其它中间过程的，均应进行中间检测。承包商得到监理工程师中间检测认可的凭证后，才能继续施工。
3	单位工程	在单元工程、分部工程检测的基础上，对单元、分部工程质量等级的统计推断，再结合直接反映单位工程结构及性能质量的质量保证资料核查和单位工程外观质量评定，便可系统地核查结构是否安全，是否达到设计要求；结合外观等直观检查，对整个单位工程的外观及使用功能等方面质量作出全面的综合评定，从而决定是否达到工程合同所要求的质量等级，进而决定能否检测。

项目分部工程质量评定要求进行评定，合格标准为：①单元工程质量全部合格；②中间产品质量及原材料质量全部合格。优良标准为：①单元工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单元工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过任何质量事故；②中间产品质量全部合格。

单位工程质量评定，合格标准为：①分部工程质量全部合格；②中间产品质量及原材料质量全部合格；③外观得分率达到70%以上；

④施工质量检验资料齐全。优良标准为：①分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且未发生过重大质量事故；②中间产品质量全部合格，原材料产品质量合格；③外观得分率达到85%以上；④施工质量检

验资料齐全。

质量评定合格标准为分部工程质量全部合格；优良标准为分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，且主要分部工程质量优良。

根据项目分区情况，本工程水土保持工程措施包含1个单位工程，下分1个分部工程，以及1个单元工程。

表5-2 水土保持工程措施单位工程、分部工程、单元工程划分情况表

单位工程	分部工程	单元工程划分情况		
		单元工程划分原则	分区	划分结果
降雨蓄渗工程	嵌草砖铺装工程	每0.1~1hm ² 作为一个单元工程，不足0.1hm ² 的可单独作为一个单元工程，大于1hm ² 的可划分为两个以上单元工程	建筑物工程区	1
合计				1

5.2.2 竣工资料检查情况

主要检查了本项目的工程措施档案资料，查看了施工原始记录，工程管理文件，分别检查了排水、地面铺装等分项单元工程中间验证证书，原材料试验报告，单位分部工程质量检验评定表；混凝土、砂浆配合比试验报告；原材料、外购成品、半成品抽检、试验资料；水土保持工程措施的设计、设置及材料规格、质量、单项工程开工通知书、开工报告、施工原始记录以及设计变更文件及批复等。检查了各合同段的施工报告、竣工验收资料，查阅了监理规划、监理实施细则、监理日志、监理工作总结、大事记等，查阅了工程质量评估报告等资料。

现场检查和内业资料抽查结果表明：工程竣工资料、施工原始记录及自检资料齐全，内容完整、准确、系统、书写打印清晰，装订整齐，符合竣工验收资料编制要求。

5.2.3 现场质量抽查情况

对本项目进行了现场抽查，水土保持设施合格率为100%。工程组检查了景观绿化区的土地整治情况，土地恢复到满足道路建设和绿化的要求；工程管护措施到位，总体质量较好。

2、核查方法

水土保持措施的单位工程和分部工程划分，在参考工程施工监理质量检验评定资料的基础上，按照《水土保持工程质量评定规程》规定执行，对单位工程；分部工程，单元工程进行了质量检验，经检验，抽检的各项单元措施均质量合格。

表5-3 水土保持工程措施质量抽查情况表

单位工程	位置	划分结果		结论	
		数量	抽查数	合格数	合格率
透水铺装	道路工程区	10244m ²	500m ²	500m ²	100%

5.2.4 工程质量检验

对工程现场抽检表明：透水铺装工程的结构尺寸符合设计要求，施工工艺和方法符合技术规范和质量要求。

5.2.5 工程措施质量综合评估

根据抽样试验资料结合现场质量检查，工程评估组在质量评估工作中检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，认为本项目水土保持工程措施在施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立健全了“项目法人负责、监理单位控制、承包商保证、政府监督”的质量保证体系。水土保持工程的建设与管理亦纳入了整个工程的建设管理体系中。工程质量检验资料齐全，程序完善，均有施工、监理、业主单位的签章，符合质量管理的要求。工程评估组认为本项目整个项目水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品均质量合格；建筑物结构尺寸规则，外表美观，符合设计要求；施工工艺和方法符合技术规范和质量标准，各项质量证明文件完整；工程总体质量较好。综合评定质量合格。总体达到工程验收标准。

5.3 植物措施质量评价

5.3.1 检查情况和评定标准

植物措施质量检查采取查阅资料、听取汇报和外业调查相结合的办法。依据项目区植物措施任务量“点型”的特点，外业调查基本上采用踏察和重点抽样调查相结合的方法。在每个抽样区随机设立“数行”或“数地块”作为调查样方，每区样方数量不得小于2个，每个样地面积草地不得小于15m²，对样方内的林草进行现场测量和观测，检查林草成活率（保存率）、覆盖度、生长情况等。

水土保持工程质量评定规程有关规定，植物措施质量分为合格和优良两个级别。项目区适用标准为：造林成活率：大于（或等于）80%为合格，85%以上为优良。种草（包括草坪）成活率：大于（或等于）75%为合格，80%以上为优良。

表 5-5 水土保持植物措施单位工程、分部工程、单元工程划分情况表

单位工程	分部工程	单元工程划分情况		
		单元工程划分原则	分区	划分结果
植被建设工程	△点片状植被	以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积 0.1~1hm ² ，大于 1hm ² 的可划分为两个以上单元工程	景观绿化区	5
合计				5

5.3.2 植物措施检查

评估组按照评估技术规范的要求检查了项目区内的植物措施。整个场区绿化基本上做到了有规划、有设计、程序规范、资料基本齐全。

5.3.3 植物措施质量检验

建设单位在项目区内采取了合理的植物措施，不仅起到防治水土流失作用，而且在美化环境和防尘方面效果良好。植物措施养护管理到位，定期灌溉、施肥、修剪、清除杂草，组织专人看护绿地、保护树木、防治病虫害，确保问题可以得到及时处理。

评估组对绿化工程实施了现场全查，经查验，草树种配置得当，管理细致，各分区的林木成活率均达到 99% 以上，措施质量检验合格。

表5-6 水土保持植物措施外观抽查情况表

单位工程	分部工程	外观质量抽查情况	结论
植被建设工程	△点片状植被	植被生长旺盛，草本覆盖度较高	合格

表5-7 水土保持植物措施质量抽查情况表

单位工程	分部工程	位置	单元工程验评情况		结论	
			数量	抽查数	合格数	合格率
植被建设工程	△点片状植被	项目区	8	4	4	100%
合计			8	4	4	100%

5.3.4 植物措施质量综合评估

根据内业资料及现场植物措施检查，植物评估组认为本项目较好完成了方案植被建设任务，树种的选择合理，管理措施得力，成活率较高，对保护和美化当地生态环境起到了积极的作用，植物措施总体合格。

6 水土保持监测评价

本项目由利水工程咨询有限公司进行实施工程的水土流失动态监测。分析总结出监测结果如下：水土流失总治理度99%，土壤流失控制比1，渣土防护率99%，表土保护率99%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率32.1%。

工程各项指标均达到了建设类项目水土流失防治一级标准，总体效果良好。

评估组认为：建设单位提供的监测记录、监测过程符合相关技术规范要求，监测成果可信。

7 水土保持监理评价

青岛信达工程管理有限公司承担本项目水土保持监理工作。本项目监理部成立于2018年9月，并进驻工地，项目监理部实行总监理工程师负责制，下设监理工程师、监理员。

工程项目监理组织采用直线职能型结构方案。该组织结构自总监、总监代表到各专业监理工程师，专业配套，年龄结构合理，具有同类工程监理经验，工作命令源单一且各专业监理工程师互为协作、责任分明、决定迅速、传递直接、信息反馈快捷，又具备横向沟通优势，适应本项目的监理特征，并建立了施工组织设计（方案）审查制、材料、设备、构配件进场报验及质量检验验收制度、分项工程、隐蔽工程验收制度、变更工程量签证制、材料试验取样及试件制作见证制等22个监督管理制度。

监理部主要负责质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、各方关系协调，并确保文明、安全施工，环保、水土保持达标并符合国家、地方的有关规定及要求，实施全面监理。在监理期间，监理单位开展现场质量巡查工作，对巡查中发现的问题逐一分析，通过现场指导和跟踪调查等方式完成问题处理和措施落实。总监理工程师定期召开例会，总结前期工作，并及时解决工作中遗留的问题。同时保证工程质量，积极协调组织，促进工程进度的落实，加强投资管理，提高合同管理和信息管理水平。

评估组认为：利水工程咨询有限公司按照相关要求，开展对本项目水土保持工程监理工作，有效保证了水土保持工程质量，控制了施工进度和投资进度。监理过程符合相关技术规范要求，成果详实可靠。

8 水土保持工程投资及资金管理评价

8.1 水土保持方案批复投资

根据青岛市黄岛区水利局批复的《嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持方案报告书》（报批稿），本项目水土保持总投资为647.37万元，其中工程措施投资200.21万元，植物措施投资336.71万元，临时措施投资38.60万元，独立费用26.51万元，基本预备费36.12万元。

8.2 实际完成水土保持工程投资

8.2.1 完成投资

根据水土保持工程监理资料、合同资料和工程实施结算资料核实分析，本项目实际完成的水土保持投资合计为647.37万元。详见表 8-1。

8.2.2 投资变化分析

随着主体工程设计的深入及施工过程中实际情况的变化和要求，部分水土保持工程的工程量及投资有所增减，而且实际时间和分年度投资额也有一定的变化。本工程投资变化的主要原因是：

（1）实际完成工程措施投资200.21万元。建设单位按照方案的设计，并结合现场的实际情况，工程措施布置优化后更加合理，措施量有所增加。采取的措施同样到了保持水土的目的，而且更加符合实际。

（2）植物措施投资336.71万元建设单位按照水保方案中植物措施的设计，积极采取了植被绿化，并在建设项目区内进行了景观布置，项目区内植物规格和数量都较方案有所提高。采取的植物苗木不仅能达到水保的要求，而且更加美观。。

（3）临时措施投资38.60万元，建设单位按照方案的设计，并结合现场的实际情况，临时措施尽量重复利用，措施量有所减少。但采取的措施同样到了保持水土的目的，而且更加符合实际。

（4）独立费用26.51万元，较水土保持方案无变化。

（5）水土保持补偿费

本项目已申请免交水土保持补偿费

8.3 投资控制和财务管理

8.3.1 投资控制

本项目的水土流失防治经费由建设单位承担，已列入本项目投资总概算，其支付与主体工程价款的支付程序相一致，结算程序严格按甲乙双方签订的合同执行。在该工程建设过程中，根据工程建设监理合同中业主授予的权限，以施工承建合同文件为依据，对工程投资进行严格的控制，投资控制方法包括工程量控制和工程款支付控制。

8.3.2 财务管理

为加强企业财务管理，规范公司内部行为，充分发挥资金的使用效益，实现财务管理科学化、制度化、规范化，根据《企业财务通则》、《国有建设单位会计制度》及有关规定，结合实际情况，青岛西海岸新区建筑工务中心制定了包括建设资金管理、流动资产、固定资产、低值易耗品管理等的财务管理办法。

8.3.3 合同管理

在项目计划合同管理上青岛西海岸新区建筑工务中心依据《合同管理实施细则》、《变更设计管理实施细则》、《工程施工管理办法》、《监理管理实施细则》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《文明施工及环境保护管理办法》、《竣工文件编制移交实施细则》等管理办法，建立健全内部质量管理体系。合同管理实施细则主要包括工程暂停及复工、工程变更的处理、费用索赔的处理等有关内容。在项目实施过程中，严格遵守各合同管理条款。

8.3.4 经济财务评价总结

本项目管理部门的财务管理机构与财务管理制度健全，计划、工程、财务与监理等部门和单位能够严格执行国家有关财经法规，相互配合、相互监督、共同控制，在施工材料采购、物资管理、投资控制和价款结算等方面比较严格的，财务管理比较规范。本项目建设过程中，建设单位落实了水土保持措施的资金，保证了各项措施的实施。财务经济评估组认为可以对本项目水土保持设施进行竣工验收。

9 水土保持效果评价

9.1 水土流失治理情况

经实际测定计算，项目六项指标达到值如下：水土流失总治理度99%，土壤流失控制比1，渣土防护率99%，表土保护率99%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率32.1%。

工程达到水土流失防治一级标准和评估目标，起到了预防和治理水土流失的效果，各项指标见表 9-1 所示。

表 9-1 水土流失防治指标对比分析表

防治目标	一级标准	方案目标值	评估目标值
水土流失总治理度	95%	95%	99%
土壤流失控制比	1	1	1
渣土防护率	98%	98%	99%
表土保护率	95%	95%	99%
林草植被恢复率	97%	97%	99%
林草覆盖率	27%	27%	32.1%

(1) 扰动土地整治率

项目施工共扰动土地总面积7.86hm²，方案实施后建设期共治理扰动面积7.85hm²，扰动土地整治率达到99%。总体效果良好。

(2) 水土流失治理度

项目区水土流失面积为7.86hm²，各项水土流失治理达标面积合计为7.85hm²，计算得到项目区水土流失治理度为99%。

(3) 土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度的之比。

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》及批复的水保方案，该工程所在区域容许土壤流失量为200t/km²·a。根据土壤流失量监测结果，经预测，设计水平年该项目治理后的可达到平均土壤侵蚀模数为200t/km²·a，则土壤流失控制比为1.0。

(4) 拦渣率

项目区产生的临时堆土为1.26万m³，采取措施设计拦渣量为1.25万m³，则

拦渣率达到99%。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率，是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。林草植被恢复率达到99%。

（6）林草覆盖率

植被覆盖率，是指林草植被面积占项目建设区面积的百分比。项目占地总面积2.52hm²，林草覆盖率达到32.1%。

9.2 公众满意度调查

根据技术评估工作的有关规定和要求，在评估工作过程中，综合组向工程附近当地群众发放了100张水土保持公众调查表进行民意调查，回收89张调查卷。调查的目的在于了解本工程水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，公众对本工程水土保持的意见和建议，同时可作为本次技术评估工作的参考内容。调查范围主要为工程周边的村镇，调查对象有老年人、中年人和青年人。被调查中有76人了解或听说过本工程，其中72.31%的人认为本工程对当地经济发展具有积极影响，57.62%的人认为项目对当地环境有好的影响，87.99%的人认为项目区林草植被建设的成效较好，83.54%认为本工程建设中的临时堆土防护、弃土弃渣管理成效较好，91.42%的人认为本工程建设扰动土地的恢复程度较好。满意度调查表详见表9-5。

表9-5 公众满意度调查表

调查内容	观点	人数	比例
您对本工程的了解程度	了解	22	24.72%
	听说过	48	53.93%
	从未听说过	19	21.35%
您认为本工程对当地经济发展有什么影响	具有积极影响	75	84.27%
	有消极影响	2	2.25%
	影响一般	9	10.11%
	不清楚	3	3.37%
您认为本工程建设对当地总体环境的影响程度	影响较好	33	37.08%
	影响较差	0	0.00%
	影响一般	48	53.93%
	不清楚	8	8.99%
您认为本工程建设中的林草植被建设的成效如何？	较好	67	75.28%
	较差	0	0.00%
	一般	17	19.10%
	不清楚	5	5.62%
您认为本工程建设中的临时堆土防护、弃土弃渣管理成效如何？	较好	59	66.29%
	较差	0	0.00%
	一般	17	19.10%

	不清楚	13	14.61%
您认为本工程建设扰动土地的恢复程度如何？	恢复较好	73	82.02%
	恢复较差	0	0.00%
	恢复一般	14	15.73%
	不清楚	2	2.74%

10 水土保持设施管理维护评价

本项目于2018年9月份开工建设，2020年6月全部竣工，主体工程的水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已完成。青岛西海岸新区建筑工务中心专门成立了管理养护部门，设立了明确的管理制度，由专人负责水土保持设施的管护和维修。对水土保持措施实施的质量、数量进行跟踪调查，对运行中出现的局部损坏及时进行修复、加固，对林草措施及时抚育、补植。从运行情况看，有关水土保持管理职责落实，效果良好。评估组认为运行单位做到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落实，能够保证水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

11 完善意见

评估组首次勘查现场，对水土保持工程资料、监理资料、监测资料等进行了查阅，并对本工程水土保持措施进行了全面检查；按照涵盖各种水土保持措施的原则，对重要单位工程进行重点检查，如排水、植物绿化等防护措施等。

建设单位对完善后的水保设施进行了自查初检，并向评估小组汇报了整改工作情况。在此基础上，评估小组多次勘查现场。

经多次现场考察，评估小组认为嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程已具备验收条件，并在复核基础上进一步完善了评估报告，按照相关程序向西海岸新区城市管理局汇报了评估结果，获得了进入验收程序的批准。

12 综合评估

在项目建设中，建设单位能够按照水土保持法律、法规的有关规定，及时编报水土保持方案；在工程建设期间能够履行水土流失防治责任，积极落实扰动范围内的各项水土保持措施，完成了建筑物工程区、道路广场区、景观绿化区和施工临建区等防治区域的水土保持措施。目前项目区水土保持工程措施已发挥作用，大部分区域的植被生长较好，有效保护和改善了项目区生态环境。

经内业资料查阅和外业实地核查，评估组认为：嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程水土保持措施布局合理，主体工程中的工程及植物措施数量齐全，质量合格；新增水土保持工程和植物措施符合设计和规范要求、质量合格。各项水土保持设施未发现重大质量缺陷，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，能够满足国家对生产建设项目水土保持的要求。水土流失总治理度99%，土壤流失控制比1，渣土防护率99%，表土保护率99%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率32.1%。工程达到水土流失防治建设类一级标准和评估目标，起到了预防和治理水土流失的效果，各项措施达到了评估目标，较好地发挥了防治水土流失的作用。

综上所述，评估组认为：嘉陵江路连接线（长江东路——现状嘉陵江路）道路及管网工程已较好地完成了方案要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。

13 遗留问题及建议

对景观绿化区域内生长状态不好的植物加强管护，对成活率不高的区域及时进行补植，做好现有绿化措施的管理维护工作。

定期检查排水设施，加强检查和整修，保证主体工程的安全运行。
